

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT**

Rodovia: BR-101/SC

Município: Tubarão

Km: 342+500 Norte e Sul

**ENTREGA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA –
TUBARÃO - KM 342+500 NORTE E SUL - BR-101/SC**

**RELATÓRIO DE
IMPLANTAÇÃO DE
PASSARELA KM 342+500
NORTE E SUL**

Agosto/2023

**IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA
RODOVIA BR-101/SC
Km 342+500 SUL**

SUMÁRIO

I.	OBJETO	2
II.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	2
1.	LOCALIZAÇÃO DA OBRA.....	2
III.	SERVIÇOS REALIZADOS	3
IV.	ACOMPANHAMENTO DA OBRA.....	9
V.	CONCLUSÃO.....	11

I. OBJETO

O objeto deste relatório consiste em registro fotográfico com a comprovação da conclusão da obra de Implantação de passarela, localizada no km 342+500, sentido NORTE E SUL, da BR-101/SC, município de Tubarão, Estado de Santa Catarina.

II. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Nome da obra	-	Implantação de passarela
Rodovia	-	BR-101/SC
km	-	342+500
Sentido	-	Norte e Sul
Município/Estado	-	Tubarão/SC

Vista aérea do local da Obra de Implantação de passarela do km 342+500 S



III. SERVIÇOS REALIZADOS

Figura 01 – Projeto geométrico

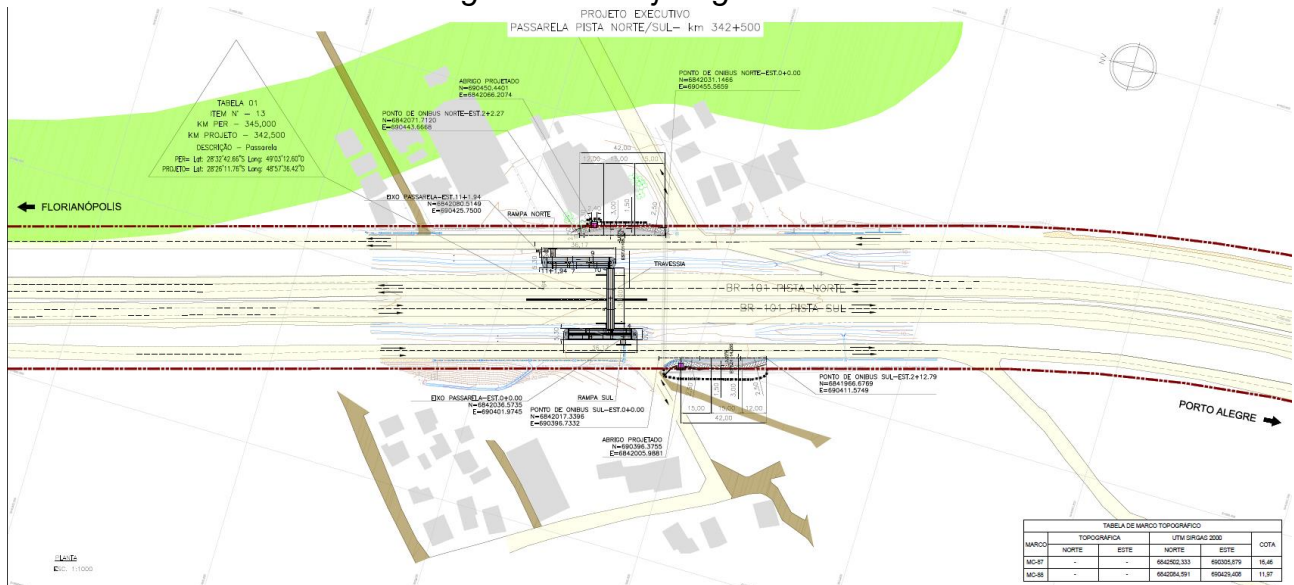


Figura 02 – Aérea



Figura 03 – Passarela/Rampa Sul



Figura 04 – Passarela/Rampa Sul



Figura 05 – Passarela/Rampa Sul



Figura 06 – Passarela/Rampa Norte



Figura 07 – Passarela/Rampa Norte



Figura 08 – Ponto de ônibus Norte



Figura 09 – Ponto de ônibus Norte



Figura 10 – Ponto de ônibus Sul



Figura 11 – Ponto de ônibus Sul



Figura 12 – Iluminação Norte



Figura 13 – Iluminação Sul



Figura 14 – Aérea



Figura 15 – Aérea



IV. ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Abaixo, apresentamos o acompanhamento que foi realizado ao longo da execução da obra, deste a sua liberação até a conclusão.

Há o acompanhamento mensal, demonstrando a evolução de cada uma das frentes de serviços, tais como:


- Sinalização provisória;
- Limpeza de terreno;
- Drenagem;
- OAE;
- Sub-base;
- Base;
- Revestimento (Paver);
- Sinalização Horizontal;
- Sinalização Vertical;
- Dispositivo de Segurança;
- Paisagismo/ Limpeza Canteiro e Serviços Finais.

Avanço Físico (Executado) - BR-101 Passarela do km 342+500

		Períodos	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Sinalização provisória	Mensal						100%			
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Limpeza do Terreno	Mensal						100%			
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Camadas Finais Terrapl.	Mensal								100%	
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Drenagem	Mensal								80%	20%
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%
OAE	Mensal						11%	69%	20%	
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	11%	80%	100%	100%
Sub-Base	Mensal								100%	
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Base	Mensal								100%	
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Revestimento (Paver)	Mensal									100%
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Sinalização Horizontal	Mensal								10%	90%
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%
Sinalização Vertical	Mensal								20%	80%
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%
Disp. de Segurança	Mensal								33%	67%
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	100%
Paisagismo / Limpeza Canteiro / Serviços Finais	Mensal								10%	90%
	Acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%
TOTAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,68%	43,47%	31,97%	11,88%

BR-101 Passarela do km 342+500											
ETAPAS		Serviços								ETAPAS	
Descrição	PESO (%) - A -	Descrição - B -	Peso (%) - C -	Acumulado até o Mês		Acumulado Ponderado		Soma dos Serviços		Previsto(%)	Executado (%)
				Previsto (%) - D -	Executado (%) - E -	Previsto (%) (C x D)	Executado (%) (C x E)	Previsto (%) - F -	Executado (%) - G -		
Sinalização Provisória	5%	Mobilização	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	5,0%	5,0%
Terraplenagem	5%	Limpeza do Terreno	15%	100%	100%	15%	15,0%	100,0%	100,0%	5,0%	5,0%
		Camadas Finais Terrapl.	85%	100%	100%	85%	85,0%				
O.A.E. e Drenagem	70%	Drenagem	10%	100%	100%	10%	10,0%	100,0%	100,0%	70,0%	70,0%
		OAE	90%	100%	100%	90%	90,0%				
Pavimentação	10%	Sub-Base	40%	100%	100%	40%	40,0%	100,0%	100,0%	10,0%	10,0%
		Base	40%	100%	100%	40%	40,0%				
		Revestimento (Capa)	20%	100%	100%	20%	20,0%				
Sinalização/Disp. de Segurança	5%	Sinalização Horizontal	35%	100%	100%	35%	35,0%	100,0%	100,0%	5,0%	5,0%
		Sinalização Vertical	35%	100%	100%	35%	35,0%				
		Disp. de Segurança	30%	100%	100%	30%	30,0%				
Serviços Complementares	5%	Paisagismo / Limpeza de Canteiro / Serviços Finais	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	5,0%	5,0%
Mês de Acompanhamento: ago/23		Avanço Físico da Obra: BR-101 Passarela do km 342+500								100,0%	100,0%

BR-101 - Passarela km 342+500

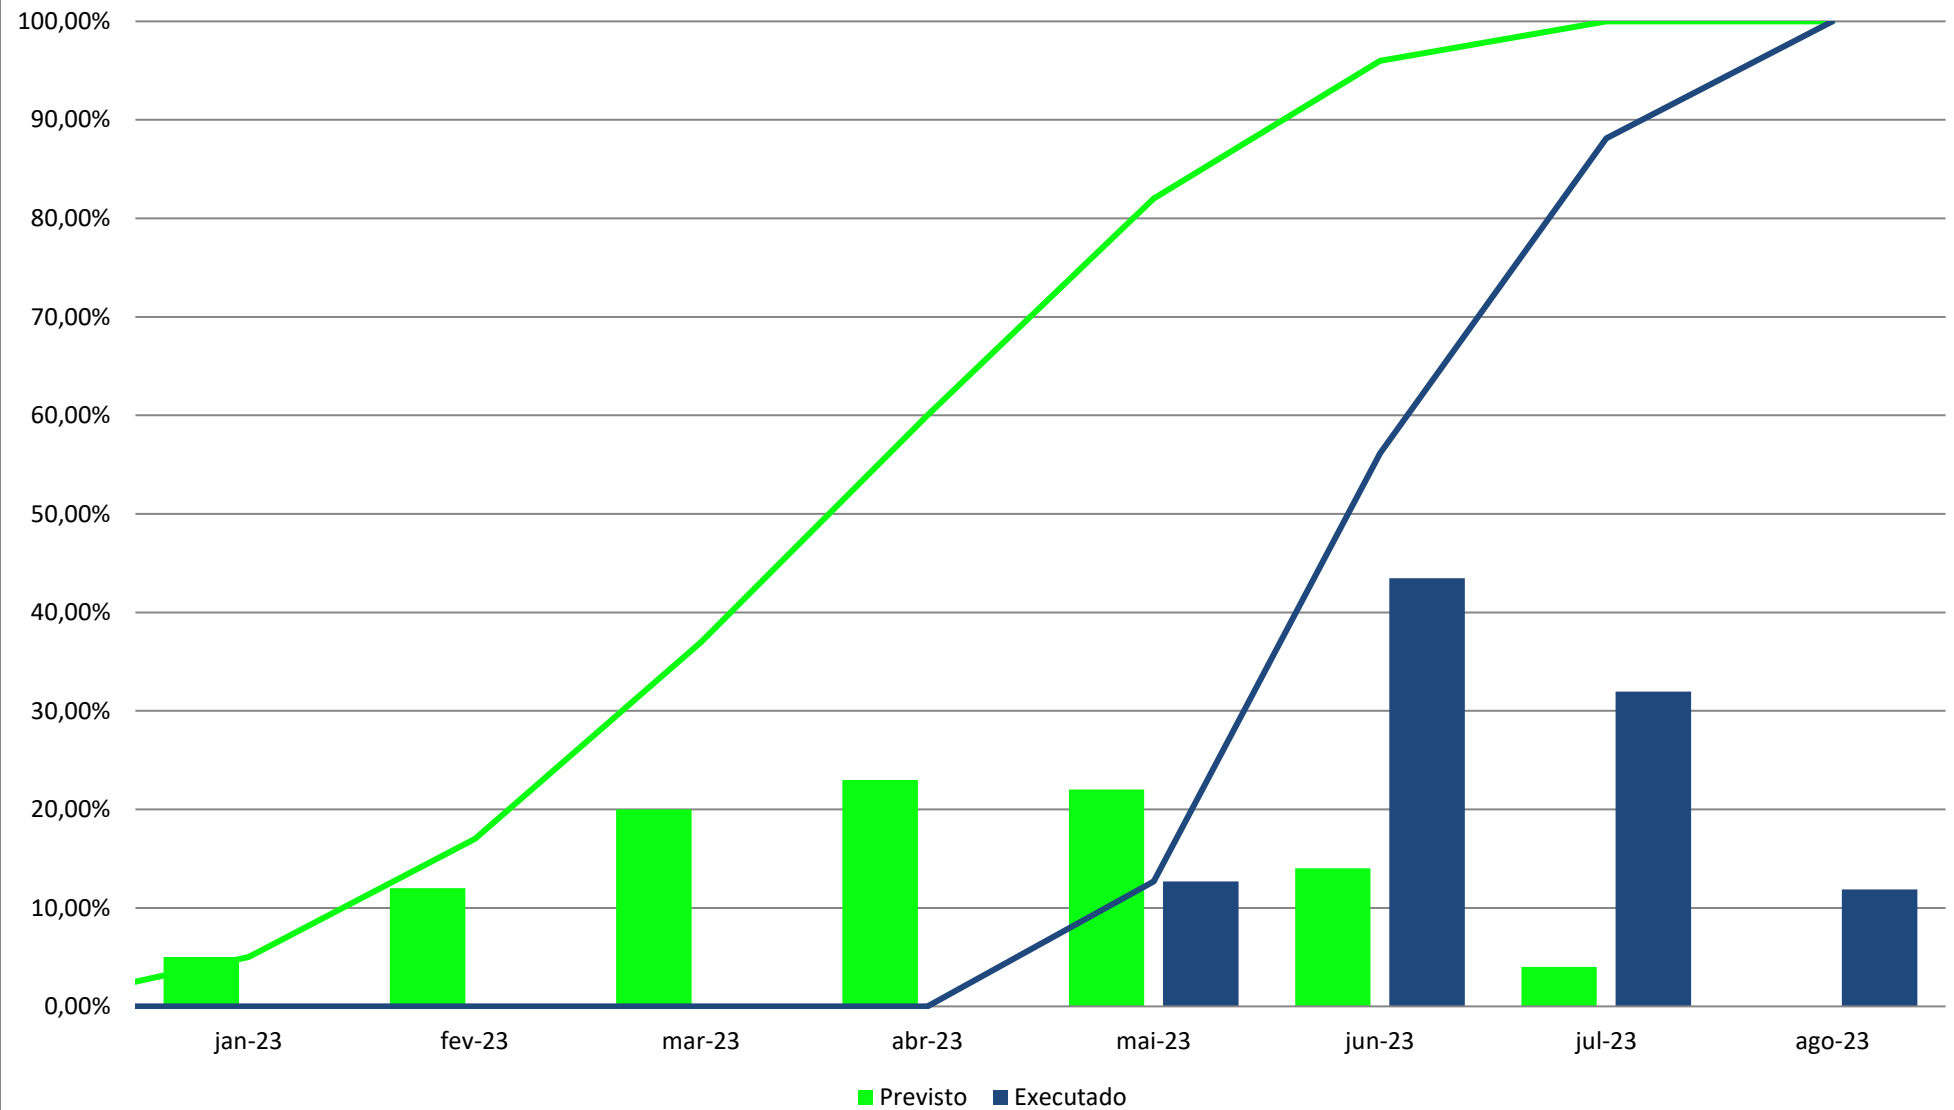

V. CONCLUSÃO

Entende-se assim a entrega concluída da obra de Implantação de passarela, localizada no km 342+500 da BR-101/SC, no município de Tubarão.

Pronto para quaisquer esclarecimentos adicionais.
